

RENOVATION KIRCHE SCHIERS

Zwischenbericht Stand der Arbeiten 11. Oktober 2024

Die Renovationsarbeiten an der reformierten Kirche Schiers schreiten zügig voran. Die Aussenrenovation wird bis im November dieses Jahres abgeschlossen, sofern das Wetter weiter so gut mitmacht. Folgende Arbeiten wurden bisher ausgeführt:

29.04.2024: Start Bauarbeiten

- Mai:
- Grabarbeiten im Pfarrhausgarten, auf Schuderserstrasse und Friedhof für Fernwärmeleitung Pfarrhaus – Kirchturm sowie beim seitlichen Eingang der Kirche für den neuen Wasseranschluss im Turm
 - Anschluss Wasser-/Abwasserleitungen, Anpassung Elektrozuleitungen
 - Grabarbeiten um Kirche herum für Ringerder (Blitzschutzanlage), Verlegung möglichst nahe an Kirche zum Erhalt des Gehweges
 - Grabenverfüllung
 - Sicherheitstechnische Ergänzungen Aufgang Turm innen

26.05.2024: Baustartfest für die Bevölkerung mit Information, Musik und Unterhaltung

- Juni:
- Eingerüstung Kirche und Turm
 - Begutachtung Blechdach Turmzwiebel, definitiver Entscheid zum Ersatz der Blecheindeckung
 - Demontage Uhrzeiger, Zifferblätter und Glockenklöppel
 - Besprechung Stand Aussenrenovation mit Denkmalpflege GR
 - Montage neue Klöppel

- Juli:
- Empfehlung Orgelkommission für Vergabe, Entscheid Kirchgemeindevorstand für Metzler Orgelbau AG
 - Entfernung Anstriche Turm und Kirche
 - Verputzreparaturen Fassaden
 - Bemusterung Aussenbeleuchtung

09.08.2024: Demontage Turmschmuck, Öffnung Zeitdokumente in Kugel

- August:
- Rückbau Dach Turmzwiebel
 - Reparaturen Zimmerarbeit und Dachschalung
 - Beginn Neueindeckung Turmzwiebel
 - Spenglerarbeiten

- September:
- Reinigung Dach Kirche
 - Malerarbeiten Fenster
 - Bemusterung Fassadenfarbe, Start Malerarbeiten Fassaden
 - Abschluss Eindeckung Turmzwiebel

01.10.2024: Bestückung Zeitkapseln mit Konfirmanden

07.10.2024: Wiedermontage Turmschmuck + Einsetzen der Zeitkapseln in der Turmkugel

- Oktober:
- Wiedermontage Zifferblätter + Zeiger
 - Abschluss Steuerung Kirchturmtechnik / Uhrwerk
 - Abschluss Neuanstrich Fassaden
 - Abgerüstung Kirche

- Ausblick:
- Abgerüstung Turm November
 - Instandstellen Umgebung November
 - Innenrenovation Herbst 2025 – Herbst 2026



Montage Turmgerüst



Abnahme Turmschmuck




Reparaturen Dachstuhl/Schalung Zwiebel




Beginn Blecheindeckung



Erneuerung Dachschalung Zwiebel

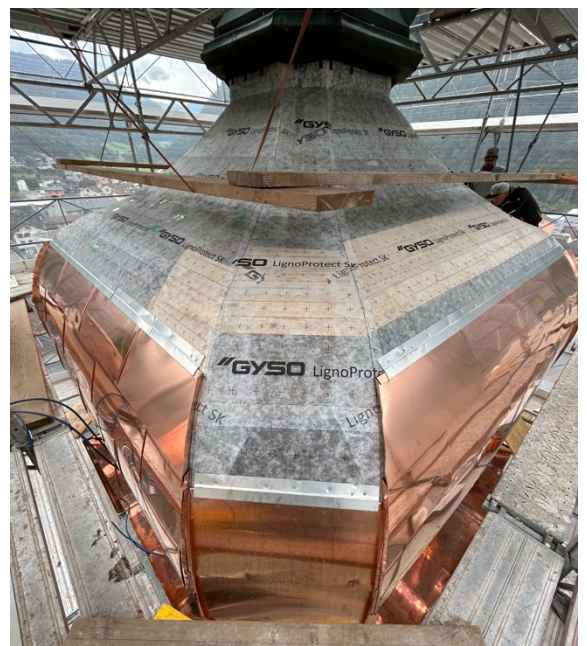

neue Eindeckung Turmzwiebel

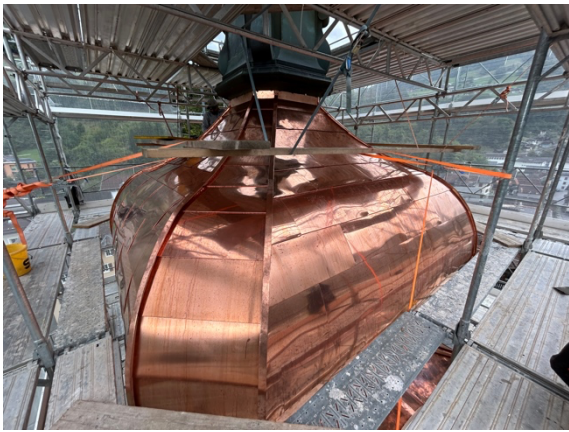

fertige Eindeckung Zwiebel



restaurierter Turmschmuck



Abgerüstet Kirche



fertiger Fassadenanstrich Kirche



Turmuhre revidiert



Uhrwerk revidiert

Malans

Patrick Buchli, dipl. Techniker HF Hochbau / cw
